Student | WebDocTruyen
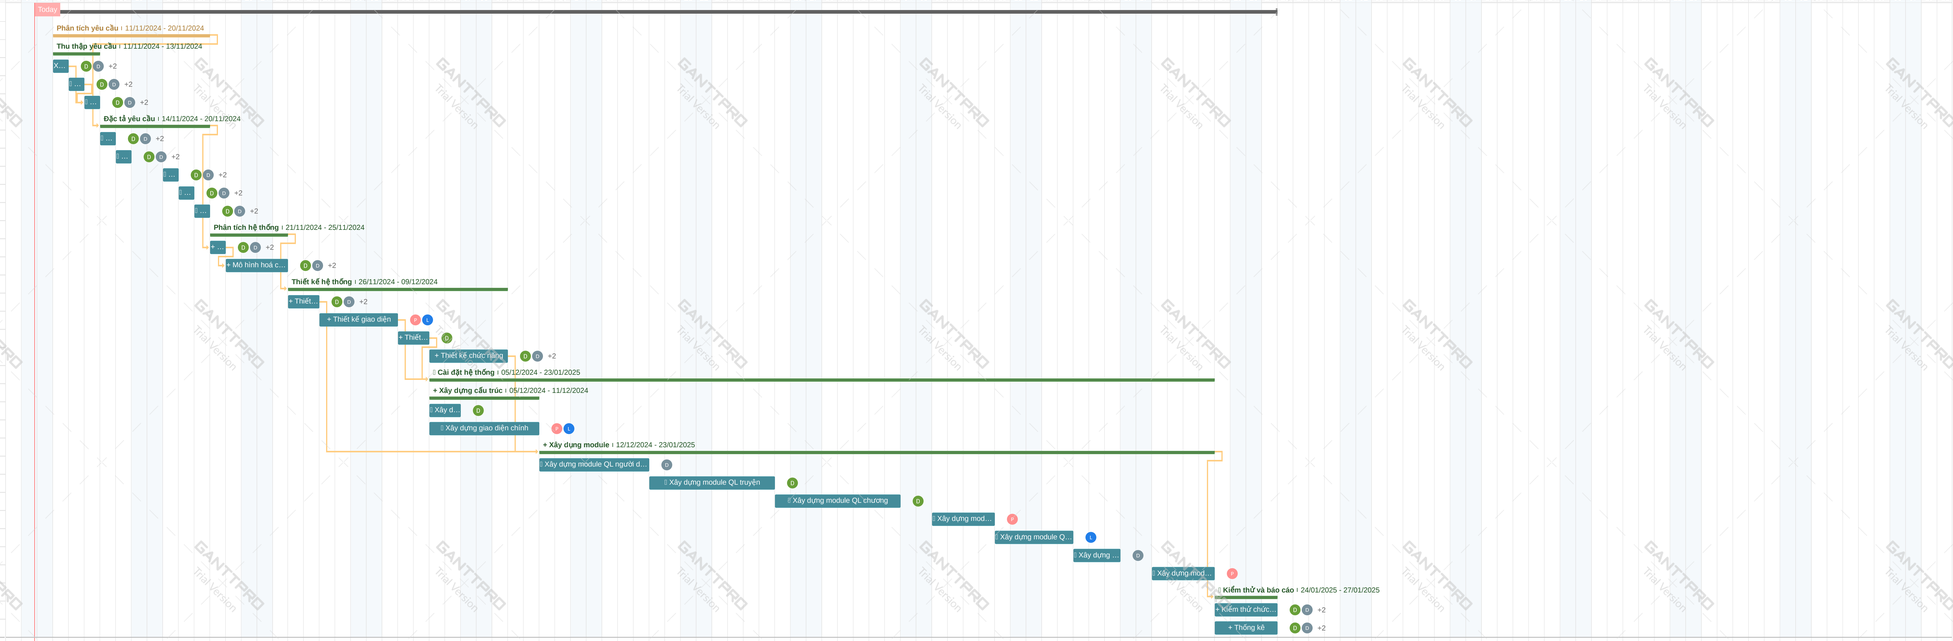
	Task name	Assigned	Start date	End date	Duration	Progress	Status	Predecessor
			11/11/2024 09:00	**27/01/2025 18**	56d	100%		
1	**Phân tích yêu cầu**		**11/11/2024 09:00**	**20/11/2024 18**	**8d**	100%		
1.1	**Thu thập yêu cầu**		**11/11/2024 09:00**	**13/11/2024 18**	**3d**	100%		
1.1.1	Xác định các bên liên quan	D, G +2	11/11/2024 09:00	11/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.1.2	Kỹ thuật thu thập dữ liệu	D, G +2	12/11/2024 09:00	12/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.1.3	Ghi lại yêu cầu	D, G +2	13/11/2024 09:00	13/11/2024 18	1d	100%	Done	1.1.1, 1.1.2
1.2	**Đặc tả yêu cầu**		**14/11/2024 09:00**	**20/11/2024 18**	**5d**	100%		**1**
1.2.1	Yêu cầu chức năng	D, G +2	14/11/2024 09:00	14/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.2.2	Yêu cầu phi chức năng	D, G +2	15/11/2024 09:00	15/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.2.3	Yêu cầu người dùng	D, G +2	18/11/2024 09:00	18/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.2.4	Yêu cầu kỹ thuật	D, G +2	19/11/2024 09:00	19/11/2024 18	1d	100%	Done	
1.2.5	Giới hạn và điều kiện	D, G +2	20/11/2024 09:00	20/11/2024 18	1d	100%	Done	
2	**Phân tích hệ thống**		**21/11/2024 09:00**	**25/11/2024 18**	**3d**	100%		
2.1	Xác định yêu cầu hệ thống	D, G +2	21/11/2024 09:00	21/11/2024 18	1d	100%	Done	1.2
2.2	Mô hình hoá các yêu cầu	D, G +2	22/11/2024 09:00	25/11/2024 18	2d	100%	Done	2.1
3	**Thiết kế hệ thống**		**26/11/2024 09:00**	**09/12/2024 18**	**10d**	100%		**2**
3.1	Thiết kế kiến trúc	D, G +2	26/11/2024 09:00	27/11/2024 18	2d	100%	Done	
3.2	Thiết kế giao diện	P, L	28/11/2024 09:00	02/12/2024 18	3d	100%	Done	
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	D DUONG P...	03/12/2024 09:00	04/12/2024 18	2d	100%	Done	
3.4	Thiết kế chức năng	D, G +2	05/12/2024 09:00	09/12/2024 18	3d	100%	Done	
4	**Cài đặt hệ thống**		**05/12/2024 09:00**	**23/01/2025 18**	**36d**	100%		**3.3, 3.2**
4.1	**Xây dựng cấu trúc**		**05/12/2024 09:00**	**11/12/2024 18**	**5d**	100%		
4.1.1	Xây dựng csdl	D DUONG P...	05/12/2024 09:00	06/12/2024 18	2d	100%	Done	
4.1.2	Xây dựng giao diện chính	P, L	05/12/2024 09:00	11/12/2024 18	5d	100%	Done	
4.2	**Xây dựng module**		**12/12/2024 09:00**	**23/01/2025 18**	**31d**	100%		**3.4, 3.1**
4.2.1	Xây dựng module QL người dùng	G Đạt	12/12/2024 09:00	18/12/2024 18	5d	100%	Done	
4.2.2	Xây dựng module QL truyện	D DUONG P...	19/12/2024 09:00	26/12/2024 18	6d	100%	Done	
4.2.3	Xây dựng module QL chương	D DUONG P...	27/12/2024 09:00	03/01/2025 18	6d	100%	Done	
4.2.4	Xây dựng module QL tài khoản	P Phương	06/01/2025 09:00	09/01/2025 18	4d	100%	Done	
4.2.5	Xây dựng module QL tìm kiếm	L Lộc	10/01/2025 09:00	14/01/2025 18	3d	100%	Done	
4.2.6	Xây dựng module QL phản hồi	G Đạt	15/01/2025 09:00	17/01/2025 18	3d	100%	Done	
4.2.7	Xây dựng module quản trị	P Phương	20/01/2025 09:00	23/01/2025 18	4d	100%	Done	
5	**Kiểm thử và báo cáo**		**24/01/2025 09:00**	**27/01/2025 18**	**2d**	100%		**4.2**
5.1	Kiểm thử chức năng	D, G +2	24/01/2025 09:00	27/01/2025 18	2d	100%	Done	
5.2	Thống kê	D, G +2	24/01/2025 09:00	27/01/2025 18	2d	100%	Done
